


PLANILHA DE MEDIÇÃO DA OBRA			Medição Nº: 18	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 01 - DISTRITO DE AGRO CAFEEIRA				
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SENER LTDA				
CNPJ: 01.884.064/0001-65				
DATA DA MEDIÇÃO: 12/12/2024		Período: 26/09/2024 a 11/12/2024		
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 183/2022				
TOMADA DE PREÇOS: Nº 12/2022 - CONTRATO: Nº 134/2022				
EMPENHOS: Nº 19992/2022, 19993/2022, 9165/2024 e 15286/2024				
Descrição do serviços executados	% Medido do Item	Valor Medido do Item		
1 - MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS				
2 - MOVIMENTO DE TERRA				
3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
4 - ALVENARIA - VEDAÇÃO				
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO				
6 - COBERTURA				
7 - REVESTIMENTOS				
8 - ESQUADRIAS	11,60%	R\$ 12.089,97		
9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,23%	R\$ 26.135,63		
10 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9,97%	R\$ 14.171,71		
11 - AR-CONDICIONADO	16,48%	R\$ 2.891,37		
12 - GASES ESPECIAIS				
13 - LIMPEZA E ARREMATOS FINAIS	100,00%	R\$ 1.336,81		
14 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL)				
15 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)				
16 - ITENS ACRESCIDOS (CONTRATO ORIGINAL)				
17 - ITENS ACRESCIDOS (EXTRA CONTRATUAL)				
TOTAL DA MEDIÇÃO =		R\$ 56.625,49		
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL = R\$ 1.134.133,50				
VALOR DOS ADITIVOS = R\$ 164.810,29				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO = R\$ 1.298.943,79				
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL = R\$ 1.116.727,34				
% DE CONCLUSÃO DA OBRA (CONTRATO ORIGINAL) = 98,47%				
VALOR ACUMULADO DO CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS = R\$ 1.279.759,65				
% DE CONCLUSÃO (CONTRATO ORIGINAL + ADITIVOS) = 98,52%				
Valor do Empenho nº 19992/2022 = R\$ 55.024,10				
Valor do Empenho nº 19993/2022 = R\$ 1.601,39				
Valor do Empenho nº 9165/2024 =				
Valor do Empenho nº 15286/2024 =				

RESUMO DA MEDIÇÃO		
Novo Valor ATUAL do Contrato:	R\$ 1.298.943,79	
Total desta Medição:	R\$ 56.625,49	
Medições Acumuladas C/ ADT.(R\$):	1.279.759,65	
Medições Acumuladas C/ ADT.(%):	98,52%	
Saldo Contratual (C/ ADITIVOS):	R\$ 19.184,14	
CONTROLE GLOBAL DO CONTRATO		
Nº DA MEDIÇÃO	VALOR PAGO	% DA MEDIÇÃO (Relação ao Global)
01	R\$ 18.309,16	1,61%
02	R\$ 75.262,64	6,64%
03	R\$ 73.898,56	6,52%
04	R\$ 50.230,86	4,43%
05	R\$ 25.967,90	2,29%
06	R\$ 95.597,92	8,43%
07	R\$ 50.084,33	4,42%
08	R\$ 106.549,57	9,39%
09	R\$ 114.298,81	10,08%
10	R\$ 75.438,76	6,65%
11	R\$ 126.951,23	11,19%
12	R\$ 56.396,69	4,97%
13	R\$ 26.008,43	2,29%
14*	R\$ 121.447,87	9,65%
15*	R\$ 66.819,77	5,31%
16*	R\$ 91.602,94	7,28%
17**	R\$ 48.268,72	3,72%
18**	R\$ 56.625,49	4,36%
* NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA OBRA, O VALOR ATUAL DO CONTRATO		
** NOTA: CONSIDERANDO NA PORCENTAGEM DA OBRA, O NOVO VALOR ATUAL DO CONTRATO		
 ALEX BORGHETTI Engenheiro Civil CREA PR 67295/D		


OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIRA



OBRA DA UBS DE AGRO CAFEEIRA

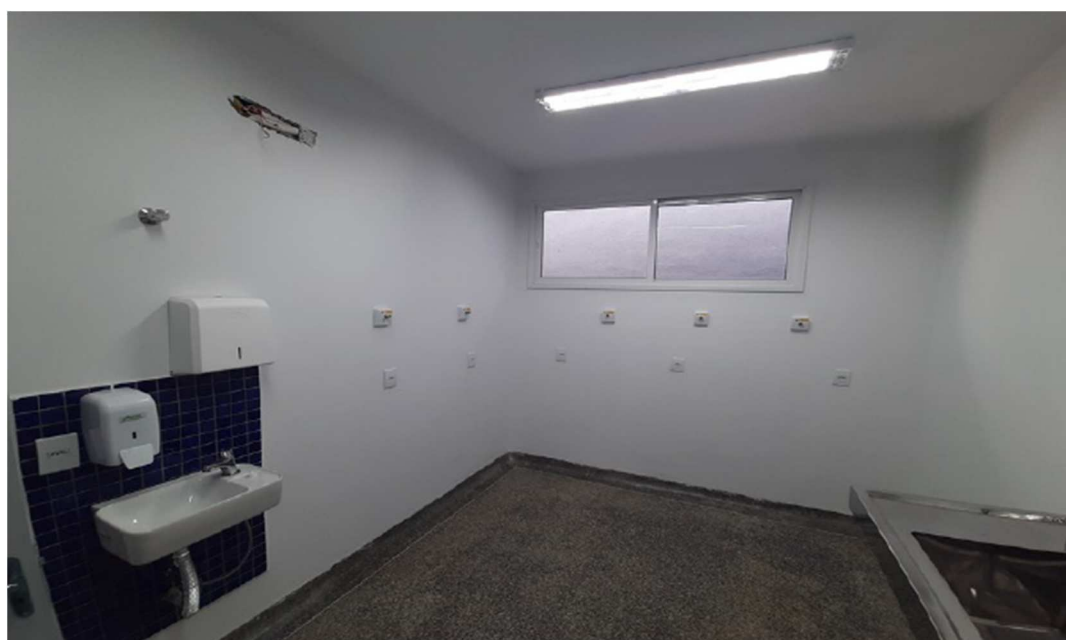

OBRA DA UBS DE AGRO CAFEIRA

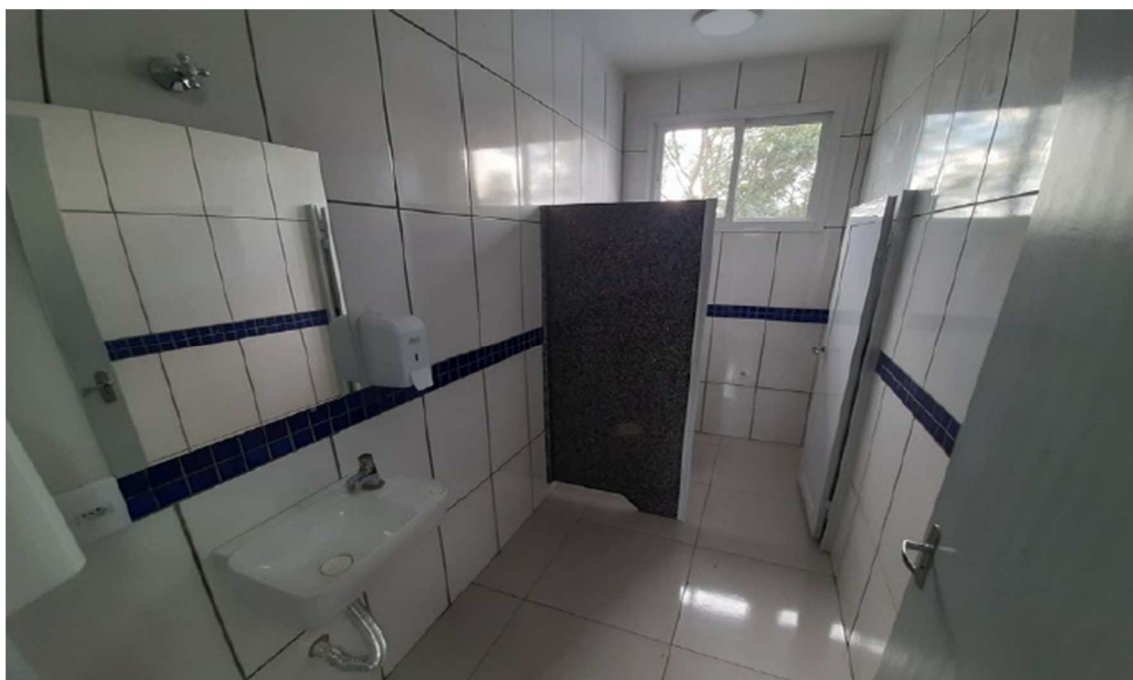

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=6eee1566-9f16-402a-805f-50c96844ffed>

