

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA					
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 01					
MUNICÍPIO: MATELÂNDIA					
REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE AGROCAFEEIRA NAS RUAS OTAVIO DUARTE DA SILVA E JOÃO PEGORARO, NA SEDE MUNICIPAL, LOTEAMENTO BOTESINI NAS RUAS ORIDES JOSÉ LORINI E MARECHAL FLORIANO, BAIRRO VILA NOVA NA RUA GENERAL DUTRA, E ESTRADA DA VILA RURAL SANTA MARIA					
DATA DA MEDIÇÃO: 11/07/2024					
PERÍODO: 17/06/2024 a 10/07/2024					
EMPRESA: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA (CNPJ 03.030.002/0001-11)					
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - CONTRATO Nº 051/2024					
INSCRIÇÃO DA OBRA: CNO Nº 90.019.59090/71					
EMPENHO Nº: 9.988/2024 e 9.989/2024					
				VALOR TOTAL DO CONTRATO =	761.000,00
				VALOR ACUMULADO (MEDIDO) =	745.740,76
				% DE CONCLUSÃO DO CONTRATO =	97,99%
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - LOTE "03"	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-		32.602,48
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	-	-		32.602,48
1.1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	11.173,63	2,85	31.844,85
1.1.1.2.	LIMPEZA DE SARJETA	M	317,00	2,39	757,63
1.2.	PLAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	-	-		694.638,26
1.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO (REPERFILAMENTO)	-	-		25.146,02
1.2.1.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	11.173,63	0,42	4.692,92
1.2.1.2.	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE),	TON	5,59	3.295,08	18.419,50
1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	TXKM	3.128,62	0,65	2.033,60
1.2.2.	REPERFILAMENTO CBUQ 2,0CM - "FAIXA D"	-	-		257.789,04
1.2.2.1.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	T	569,87	182,31	103.893,00
1.2.2.2.	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE),	TON	26,80	4.060,00	108.808,00
1.2.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	TXKM	14.998,59	0,65	9.749,08
1.2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	17.071,96	2,07	35.338,96
1.2.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO (RECAPE)	-	-		25.146,02
1.2.3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	11.173,63	0,42	4.692,92
1.2.3.2.	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE),	TON	5,59	3.295,08	18.419,50
1.2.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	TXKM	3.128,62	0,65	2.033,60
1.2.4.	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,0CM - "FAIXA D"	-	-		386.557,18
1.2.4.1.	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	T	854,78	182,31	155.834,94
1.2.4.2.	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE),	TON	40,17	4.060,00	163.090,20
1.2.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	TXKM	22.497,88	0,65	14.623,62
1.2.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.607,93	2,07	53.008,42
1.3.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	-	-		-
1.3.0.1.	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA E MICROESFERAS DE VIDRO	M2	-	29,60	-
1.4.	CONTROLE TECNOLÓGICO	-	-		18.500,02
1.4.0.1.	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - BASE	UN	-	180,77	-
1.4.0.2.	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	19,00	123,30	2.342,70
1.4.0.3.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	19,00	221,40	4.206,60
1.4.0.4.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	19,00	169,69	3.224,11
1.4.0.5.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	19,00	60,65	1.152,35
1.4.0.6.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA.	GB	1,00	7.574,26	7.574,26
				TOTAL DA MEDIÇÃO=	745.740,76
				FONTE	
				DIVISÃO DOS EMPENHOS	VALOR
				EMPENHO Nº 9.988/2024	R\$ 276.097,04
				EMPENHO Nº 9.989/2024	R\$ 469.643,72



MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA

ESTADO DO PARANÁ

Av. Duque de Caxias, nº 800, Centro – CEP 85.887-000 – Matelândia-PR
Fone: (45) 3262-8350 – Site: www.matelandia.pr.gov.br

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO COZER

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA PR 184.356/D

ART/RRT: 1720241987680

ANEXO – FOTOS DA EXECUÇÃO RESPECTIVA A MEDIÇÃO 01



Figura 1 - Serviços preliminares de limpeza de sarjetas e avanço de terra sobre as ruas



Figura 2 - Serviços preliminares de limpeza de sarjetas e avanço de terra sobre as ruas



Figura 3 - Serviços preliminares de limpeza de sarjetas e avanço de terra sobre as ruas



Figura 4 - Aplicação de Jato de água para remoção de resíduos e terra/ limpeza



Figura 5 - Rua após serviço de limpeza



Figura 6 - Aplicação de Reperfilamento pós pintura de ligação



Figura 7 - Aplicação do Reperfilamento



Figura 8 - Aplicação do Reperfilamento



Figura 9 - Implantação da capa de rolamento em CBUQ pós pintura de ligação



Figura 10 -Implantação da capa de rolamento em CBUQ



Figura 11 -Implantação da capa de rolamento em CBUQ



Figura 12 - Recape e Reperfilamento implantado na Rua General Dutra



Figura 13 - Recape e Reperfilamento implantado em Agro Cafeeira



Figura 14 - Recape e Reperfilamento implantado em Agro Cafeeira

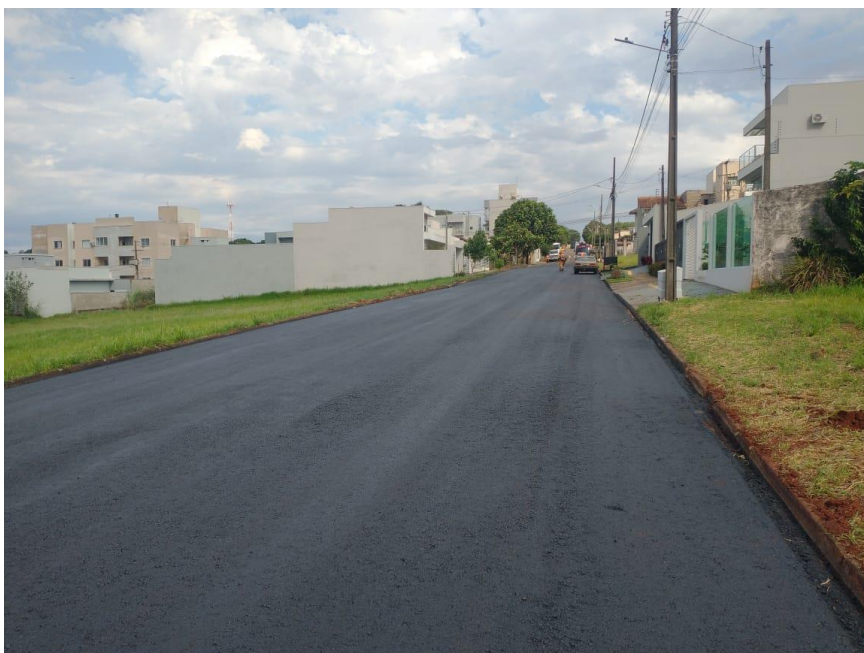


Figura 15 - Recape e Reperfilamento implantado no Loteamento Botesini



Figura 16 -Recape e Reperfilamento implantado na Vila Rural Santa Maria



Figura 17 - Realização de ensaio tecnológico

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=5d9adff4-68c4-4214-a0d0-3fb534a2b670>

