

PLANILHA DE MEDIÇÃO						
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 02						
DATA DA MEDIÇÃO: 02/10/2024						
PERÍODO: 05/09/2024 á 01/10/2024				VALOR TOTAL DA OBRA =		R\$ 109.090,93
EMPRESA CONTRATADA: EDIFICE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA						
LICITAÇÃO: 091/2024						
EMPENHO: 13431/2024						
PLANILHA DE SERVIÇOS - PINTURA CLAUDINO ZANON						
Município:	Matelândia - Pr				REF.	SINAPI
Projeto:	Ampliação e Reforma de Edificação			DATA REF.		fev/24
Local:	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO ZANON				BDI	26,44%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
			(a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
2.	PINTURA - INTERNA					R\$ 17.943,74
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	1050,90	1,35	1.418,72	
Composição 01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO EM ALVENARIA, 2 DEMÃOS.	M²	972,06	17,00	16.525,02	
3.	PINTURA - EXTERNA					R\$ 371,40
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	20,24	1,35	27,32	
Composição 01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM ALVENARIA, 2 DEMÃOS.	M²	20,24	17,00	344,08	
6.	PINTURA DA CALÇADA					R\$ 14.355,49
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	266,23	1,35	359,41	
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	200,23	69,90	13.996,08	
7.	FORRO					R\$ 2.303,40
Composição 02	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	34,34	60,00	2.060,40	
Composição 03	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	27,00	9,00	243,00	
8.	PINTURA DE SUPERFICIES METÁLICAS					R\$ 6.372,10
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	96,21	9,80	942,86	
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020/ JANELAS E PORTAS METÁLICAS	M²	121,92	29,90	3.645,41	
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020/ PORTÃO, GRADES E GUARDA-CORPO.	M²	59,66	29,90	1.783,83	
9.	PINTURA DE SUPERFICIES DE MADEIRA					R\$ 2.157,60

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS).	M²	107,88	20,00	2.157,60	
11.	DRENAGEM/ CANALETA					R\$ 2.055,00
73714/002	CAIXA DE INSPEÇÃO (CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PISO DO BARRACÃO), DIMENSÕES INTERNAS 30x30CM, PROFUNDIDADE ATÉ 40CM, EM ALV. TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM) COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO:AREIA), COM PAREDES EMBOÇADAS E BASE EM CONCRETO FCK=10 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5,00	220,00	1.100,00	
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	13,00	35,00	455,00	
73799/002	GRELHA REMOVÍVEL, EM AÇO CANTONEIRA, COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 300 MM, ESP. = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	M	5,00	100,00	500,00	
15.	TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS					R\$ 379,00
Composição Própria 06	TRATAMENTO DE FISSURA COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS	ML	5,60	60,00	336,00	
96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	1,00	43,00	43,00	
TOTAL DA MEDIÇÃO						R\$ 45.937,72

Julia Taina Gilewinski Hornel

Técnico em Edificações/ Fiscal da Obra



Imagem – Pintura Interna



Imagem – Pintura Interna



Imagem – Pintura Externa



Imagem – Pintura em grade



Imagem – Pintura de piso



Imagem – Pintura Interna



Imagem – Forro PVC



Imagem – Canaleta e grade



Imagem – Pintura Metálica



Imagem – Pintura Metálica



Imagem – Pintura em Madeira



Imagem – Pintura Interna

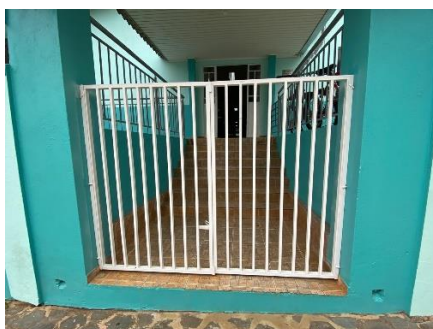


Imagem – Pintura Externa e em Metálica



Imagem – Tratamento de Fissura

JULIA TAINA GILICYSNSKI Assinado de forma digital por JULIA TAINA
GILICYSNSKI HARMEL:07375142998
HARMEL:07375142998 Dados: 2024.10.03 08:59:29 -03'00'

Julia Taina Gilicsynski Harmel

Departamento de Engenharia e Urbanismo

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=97747206-9dca-46f6-9faa-fbb25db3f0e3>

