



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0 MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA		REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
				Nº CTEF 0

RECURSO					↓
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade

RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN						Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. SERVIÇOS INICIAIS						-	399.786,09
1.1. TERRAPLANAGEM						-	399.786,09
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	2,64	-
1.2. BASE / SUB BASE						-	-
-	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H. AF_05/2020	M3	-	11,38	-
-	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	107,79	-
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
-	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	117,70	-
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
1.3. IMPRIMAÇÃO						-	6.396,44
1.3.1.	DERPR	560400	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO)	M2	1.000,00	0,45	450,00
1.3.2.	Cotação	COT16	FORNECIMENTO DE CM-30 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	1,20	4.955,37	5.946,44
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO						-	-
-	DERPR	561100	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO)	M2	-	0,31	-
-	Cotação	COT18	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	-	3.053,54	-
-	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,61	-
1.5. CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3.1CM						-	382.501,99
1.5.1.	DERPR	570000	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAXIA "C" DNIT - e = 3,5 cm (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP)	TON	790,50	190,88	150.890,64
1.5.2.	Cotação	COT13	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	36,36	3.979,29	144.686,98
1.5.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.363,28	1,40	28.508,59
1.5.4. p1w3.0.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.647,24	0,54	889,51



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	I	Apelido do Empreendimento RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA		REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN							
1.5.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	35.730,60	1,61	57.526,27 RA
1.6.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			-	-
-	DERPR	822100	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR BRANCA	M2	-	20,05	- RA
1.7.			CONTROLE TECNOLÓGICO			-	10.887,66
1.7.1.	Cotação	COT61	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	UND	14,00	234,87	3.288,18 RA
1.7.2.	Cotação	COT62	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	14,00	114,83	1.607,62 RA
1.7.3.	Cotação	COT63	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	14,00	250,53	3.507,42 RA
1.7.4.	Cotação	COT64	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	14,00	93,95	1.315,30 RA
1.7.5.	Cotação	COT65	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UND	14,00	83,51	1.169,14 RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATELÂNDIA-PR
Local
segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO DE MELO
CREA/CAU: CREA PR-140.584/D
ART/VRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0	MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN							
1.			SERVIÇOS INICIAIS			-	393.389,65
1.1.			TERRAPLANAGEM			-	393.389,65
-	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	2,64	-
1.2.			BASE / SUB BASE			-	-
-	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	-	11,38	-
-	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	107,79	-
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
-	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	117,70	-
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
1.3.			IMPRIMAÇÃO			-	-
-	DERPR	560400	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ASFALTO DILUÍDO)	M2	-	0,45	-
-	Cotação	COT16	FORNECIMENTO DE CM-30 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	-	4.955,37	-
-	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2,39	-
1.4.			PINTURA DE LIGAÇÃO			-	-
-	DERPR	561100	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO)	M2	-	0,31	-
-	Cotação	COT18	FORNECIMENTO DE RR-1C (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	-	3.053,54	-
-	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	1,61	-
1.5.			CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3.1CM			-	382.501,99
1.5.1.	DERPR	570000	EXECUÇÃO DE CAPA EM CBUQ - FAXIA "C" DNIT - e = 3,5 cm (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CAP)	TON	790,50	190,88	150.890,64
1.5.2.	Cotação	COT13	FORNECIMENTO DE CAP 50/70 (EXCLUSIVE TRANSPORTE), CONSUMO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	TON	36,36	3.979,29	144.686,98
1.5.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.363,28	1,40	28.508,59
PM3.0.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.647,24	0,54	889,51



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	I	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA ATE RIO XAXIN
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-22 (N DES.)	NOME DA EMPRESA		REGIME DE EXECUÇÃO 0 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
				Nº CTEF 0

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE E REFORÇO EM CBUQ V.ESMERALDA ATE RIO XAXIN							
1.5.5.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35.730,60	1,61	57.526,27
1.6.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			-	-
-	DERPR	822100	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR BRANCA	M2	-	20,05	-
1.7.			CONTROLE TECNOLÓGICO			-	10.887,66
1.7.1.	Cotação	COT61	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	UND	14,00	234,87	3.288,18
1.7.2.	Cotação	COT62	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM Sonda Rotativa	UND	14,00	114,83	1.607,62
1.7.3.	Cotação	COT63	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	14,00	250,53	3.507,42
1.7.4.	Cotação	COT64	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	14,00	93,95	1.315,30
1.7.5.	Cotação	COT65	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UND	14,00	83,51	1.169,14

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATELÂNDIA-PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO DE MELO

CREA/CAU: CREA PR-140.584/D

ART/RRT: 0



**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	MUNICÍPIO DE MATELÂNDA	RECAPE EM CBUQ NO VILA ESMERALDA AT00		0

% Realizado Acum.:	100,00%
--------------------	---------

% Realizado Período.: 100,00%

Período: 13/07/2023 a 07/08/2023Medição: 2[illegible]

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	TERRAPLANAGEM
3	BASE / SUB BASE
4	IMPRIMAÇÃO
5	PINTURA DE LIGAÇÃO
6	CAPA DE ROLAMENTO CBUQ 3,1CM
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
8	CONTROLE TECNOLÓGICO

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.	
2	
2	

[illegible]

Medições
Período:
Acumulado:

MATELÂNDIA-PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data


Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: MARCELO DE MELO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 140.584/D
ART/RTT: 0









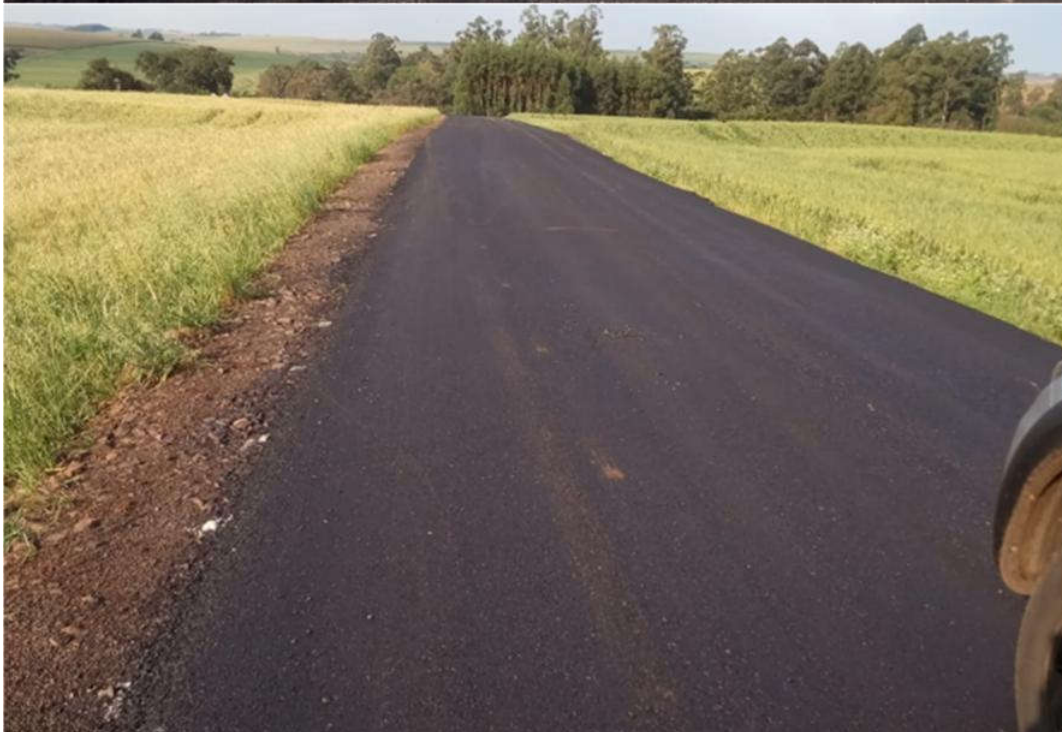

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=0e85bf2f-8bf4-4c76-aedd-4d6e16e66ba9>



Assinado por: Marcelo de Melo Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23



Assinado por: Ernesto Bado Documento assinado Digitalmente -
Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais 4.301/23 e
4.302/23



Assinado por: Maximino Pietrobon Documento assinado
Digitalmente - Lei Federal 14.129/2021 | Decretos Municipais
4.301/23 e 4.302/23
